



“ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ” ТӨҮГ

**АВТО ЗАМЫН НОРМ НОРМАТИВЫН САНГИЙН
2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН**

Улаанбаатар хот
2025.01.31

**БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН
МАГАДЛАЛ, СТАНДАРТ НОРМ НОРМАТИВЫН ХЭЛТЭС**

Танилцсан:

“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын захирал
бөгөөд Авто замын норм нормативын сангийн
Удирдах зөвлөлийн дэд дарга



Д.ОЮУНБОЛД

Хянасан:

Бодлогын хэрэгжилт, зураг төслийн магадлал,
стандарт норм нормативын хэлтсийн дарга

Г.АНХЦЭЦЭГ

Боловсруулсан:

Бодлогын хэрэгжилт, зураг төслийн магадлал,
стандарт норм нормативын хэлтсийн Стандарт
норм норматив хариуцсан мэргэжилтэн

О.ДОЛГИОН

АГУУЛГА

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ.....	4
ХОЁР. САНГИЙН 2024-2025 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	4
ГУРАВ. ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	5
3.1 Он дамжиж буй төсөл арга хэмжээ.....	5
3.2 Шинээр хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээ	5
3.3. Редакц, шүүмж хийх үйл ажиллагаа	6
3.4. Төсөл арга хэмжээний санхүүжилт	6
ДӨРӨВ. ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА	6
4.1 Сангийн хөрөнгөөр ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа	6
ТАВ. САНГИЙН ХӨРӨНГӨ БҮРДҮҮЛЭЛТ	7
ЗУРГАА. ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ	8
ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ.....	9
ХҮСНЭГТ №1	9
ХҮСНЭГТ №2	15

АВТО ЗАМЫН НОРМ НОРМАТИВЫН САН

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

“Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ нь Авто замын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2, 11.1.4 дахь заалт, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан “Авто замын норм нормативын сангийн ажиллах журам” (Сайдын 2020 оны А/121 дугаар тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон)-ын дагуу Монгол Улсын авто зам, замын байгууламжийн стандарт, норм, норматив, техникийн баримт бичгийн судалгаа хийх, боловсруулах, батлуулах, хэвлэн олшруулах, сурталчлахад шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, түүнийг зориулалтын дагуу зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах, хянах үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.

ХОЁР. САНГИЙН 2024-2025 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“Авто замын норм нормативын сан”-гийн хөрөнгөөр 2024-2025 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг боловсруулахаар шинээр болон шинэчлэн боловсруулах шаардлагатай стандарт, норм норматив, техникийн баримт бичиг, эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны ажлын саналыг Зам тээврийн хөгжлийн яамны холбогдох газар, “Монголын авто замчдын холбоо” ТББ болон Нийслэлийн замын хөгжлийн газраас авч, нэгтгэн боловсруулан тус сангийн Удирдах зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр хэлэлцүүлэн батлуулсан.

Дээрх хурлаар **1,458,518,992.00** төгрөгийн үлдэгдэл санхүүжилттэй **46** төсөл, **2,553,747,500.00** төгрөгийн өртөг бүхий шинээр хэрэгжүүлэх **49** төсөл, **853,800,000.00** төгрөгийн өртөг бүхий **9** үйл ажиллагааны зардал, нийт **4,866,066,492.00** төгрөгийн **104** төсөл, арга хэмжээ болон үйл ажиллагааны зардал батлагдсан.


Төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 95 төсөл арга хэмжээг төрлөөр нь ангилбал:

Он дамжин хэрэгжиж буй **46** төсөл арга хэмжээнд шинээр болон шинэчлэн боловсруулах **11** стандарт, **21** норм дүрэм, **3** түүхэн ном болон туршилт судалгааны **11** төсөл арга хэмжээ тусгагдсан бол 2024-2025 онуудад шинээр хэрэгжих **49** төсөл, арга хэмжээнд шинээр болон шинэчлэн боловсруулах **27** стандарт /автотээврийн багц 3 стандарт/, **17** норм дүрэм, **3** туршилт судалгаа, Авто замын сүлжээ болон норм дүрмийн хүртээмжийг сайжруулахтай холбоотой цахимжуулах **2** ажил тус тус тусгагдсан.

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 95 төсөл арга хэмжээг төсөвт өртгөөр нь ангилбал:

Төлөвлөгөөнд **2,501,325,631.00** төгрөгийн өртөг бүхий шинээр болон шинэчлэн боловсруулах **41** норм, **581,025,400.00** төгрөгийн өртөг бүхий **38** стандарт, **195,000,000.00** төгрөгийн өртөг бүхий цахимжуулах **2** ажил, **734,915,461.00** төгрөгийн өртөг бүхий **14** судалгааны ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.

**Сангийн хөрөнгөөр 2024-2025 онд хэрэгжүүлэх төслийн тоо,
хөрөнгийн хэмжээ**

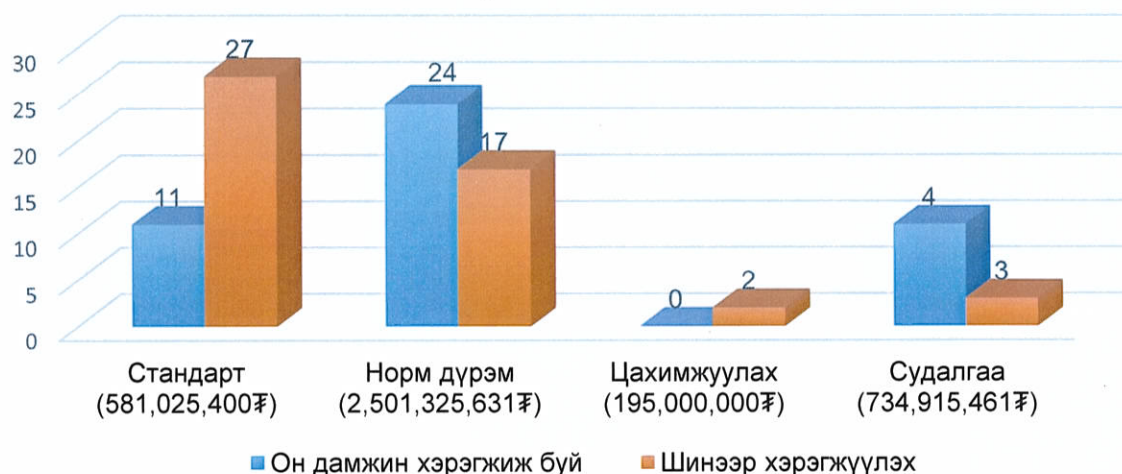

Батлагдсан төлөвлөгөөг 2024 оны 03 сарын 11-ний өдрийн 1/309, 1/310, 1/311 дугаар албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Бодлого төлөвлөлтийн газар болон Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Авто замын бодлого зохицуулалтын газарт тус тус хүргүүлсэн.

ГУРАВ. ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ


3.1 Он дамжиж буй төсөл арга хэмжээ

Сангийн төлөвлөгөөнд он дамжин хэрэгжиж буй **46** төсөл, арга хэмжээнээс **15**-н төсөл арга хэмжээ бүрэн дуусаж, холбогдох тогтоол шийдвэрүүдээр баталгаажсан бол **1** төсөл арга хэмжээ батлагдах шатанд, **1** төсөл арга хэмжээ дуусах шатанд, **19** төсөл арга хэмжээ эцсийн шатанд, байгаа бол үлдсэн **9** төсөл, арга хэмжээ нь дунд шатанд байна. **1** төсөл арга хэмжээний гэрээг цуцлахаар ажиллаж байна. /Хүснэгт №1/

3.2 Шинээр хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээ

Шинээр хэрэгжүүлэх **49** төсөл арга хэмжээнээс **5** төсөл арга хэмжээ эцсийн шатанд, **31** төсөл арга хэмжээ буюу 3-багц 21 стандарт нь дунд шатанд, **1** төсөл арга хэмжээ эхлэлийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна. Зөвлөхийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлах **4** төсөл, ажлын даалгавар шинэчлэх, батлуулахтай холбогдуулан нэмэлт судалгаа хийгдэж зарлагдаагүй **7** төсөл арга хэмжээ **1** төсөл арга хэмжээг боловсруулах шаардлагагүй болсон тул төлөвлөгөөнөөс хасагдсан байна. /Хүснэгт №2/

Сангийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт **95** төсөл, арга хэмжээний **15** нь бүрэн дууссан, **1** төсөл арга хэмжээ батлагдах шатанд, **25** нь дуусах болон эцсийн шатанд, **40** буюу 3 багц-21 стандарт дунд шатанд, **1** нь эхлэлийн шатанд, **4** нь сонгон шалгаруулалтын шатанд, үлдсэн **7** нь ажлын даалгаврыг шинэчлэн сонгон шалгаруулалтыг зарлах төсөл байна. **1** төсөл арга хэмжээг боловсруулах шаардлагагүй болсон тул төлөвлөгөөнөөс хасагдсан байна. Үүнээс **1** төсөл арга хэмжээ гэрээ цуцлахаа ажиллаж байна.

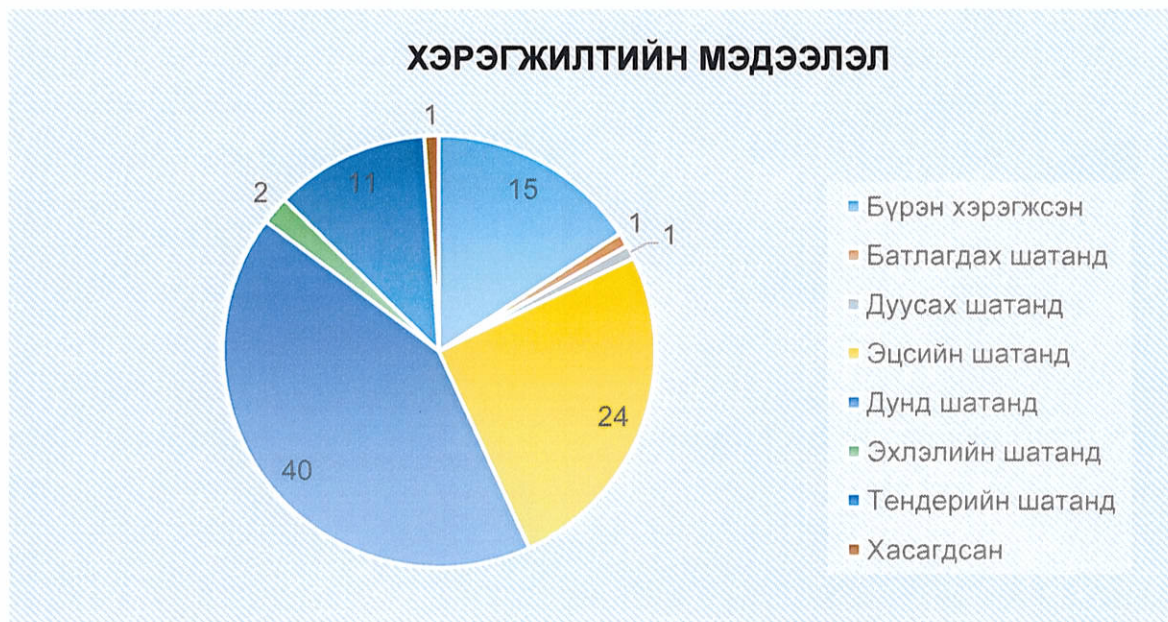

3.3. Редакц, шүүмж хийх үйл ажиллагаа

Сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний үе шатны тайлан, төсөлд редакц, шүүмж хийх ажлын хэсгийг Захирлын тушаалаар томилон 2024-2025 онд хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээнд давхардсан тоогоор нийт **30** төсөл арга хэмжээний ажлын хэсэгт **40,360,628** төгрөгийн цалин урамшууллыг журмын дагуу тооцож, батлуулан гишүүдэд олгосон байна.

3.4. Төсөл арга хэмжээний санхүүжилт

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байгаа болон шинээр гүйцэтгүүлэх төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн тодорхой төлбөрийн санхүүжилтийн хуваарийг гүйцэтгэлийн хамт боловсруулан давхардсан тоогоор **нийт 82** төсөл арга хэмжээний **1,548,095,013** төгрөгийн хүсэлтийг Зам, тээврийн яамны Санхүүгийн хэлтэст 2024 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 1/119, 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1/207, 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 1/393, 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1/512, 05 дугаар сарын 22-ны 1/677, 06 дугаар сарын 19-ны өдрийн 1/781, 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/923, 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1/996, 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 1/1074, 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 1/1325, 11 дүгээр сарын 18-ны 1/1416, 12 дугаар сарын 02-ны 1/1456, 12 дугаар сарын 06-ны 1/1513, 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 1/1577 дугаар албан бичгээр тус тус хүргүүлж, эрх нээлгэн Төвийн нормативын дансанд төвлөрүүлэн ажилласан.

ДӨРӨВ. ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

4.1 Сангийн хөрөнгөөр ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа

“Авто замын норм нормативын сангийн хөрөнгөөр 2024 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө”-г Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журмын нэгдүгээр хавсралтад заасан маягтын дагуу боловсруулж, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон Сангийн яаманд цахим хүсэлт гарган баталгаажуулж ажилласан.

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу төсөл арга хэмжээг “**Бусдаар гүйцэтгүүлэх**” буюу нээлттэй тендер шалгаруулалтыг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн хүрээнд Төрийн худалдан авах www.tender.gov.mn системээр зарлан зохион байгуулан ажиллаж байна.

Батлагдсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан **2,503,747,500** төгрөгийн өртөг бүхий шинээр хэрэгжүүлэх **49** төслийн төсөвт өртгөөс хамааруулж, нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар **3**, харьцуулалтын аргаар **32** төсөлд зөвлөхийг сонгон шалгаруулсан бол **4** төслийг шууд худалдан авах аргаар нийт **1,067,688,000** төгрөгийн өртөгтэй нэр бүхий **39** төслийн зөвлөхийг сонгон шалгаруулж, тендерийн хүчинтэй хугацаанд буюу тендер нээсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд хэлэлцээр хийн гэрээ байгуулсан.

Зөвлөхийг сонгон шалгаруулах нэр бүхий **1** төсөлд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан нээлттэй тендер зарлан ажиллаж байна. Мөн **9** төсөлд ажлын даалгавар шинэчлэх, батлуулахтай холбогдуулан нэмэлт судалгаа хийгдэж зарлагдаагүй, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулаагүй болно.

Тус газар нь “Авто замын норм нормативын сангийн хөрөнгөөр 2024 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө”-нд тусгагдаагүй худалдан авалтыг зохион байгуулаагүй, худалдан авах ажиллагааны явцад аливаа зөрчил гараагүй болно.


ТАВ. САНГИЙН ХӨРӨНГӨ БҮРДҮҮЛЭЛТ

“Авто замын тухай хууль”-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.1 дэх заалтад **Авто замын барилга, засвар, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийн ажлын төсөвт өртгийн 0.4%-аар тооцсон орлогоос “Авто замын норм нормативын сан”-г бүрдүүлэхээр заасан.**

Сангийн хөрөнгө бүрдүүлэлтэд улсын төсвөөс хэрэгжиж буй Авто замын барилга, засвар, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийн ажлын төсөвт өртгөөс 0.4%-аар тооцсон орлогыг Зам, тээврийн яамны Санхүүгийн хэлтэст хянагдаж, төрийн санд төвлөрүүлж байна.

2024 оны эхний үлдэгдэл **3,820,007,812** төгрөг үүнээс төвлөрсөн орлого **5,105,038,178** төгрөг нийт **8,925,045,990** төгрөг байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн авто замын барилга угсралт, засвар, арчлалтын ажлын **1,587,506,043** төгрөг, Нийслэл болон Барилга хот байгуулалтын яамнаас **1,097,089,174** төгрөг. Бусад төсөл хөтөлбөрүүдээс (Төмөр зам, Иргэний нисэх) **2,399,295,725** Орон нутгийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээнээс **12,661,636** төгрөг, Норм дүрэм техникийн баримт бичиг борлуулсны орлогын **8,485,600.00** төгрөгөөс тус тус бүрдэж байна.

АВТО ЗАМЫН НОРМ НОРМАТИВЫН САНД ТӨВЛӨРСӨН ОРЛОГЫН ХЭМЖЭЭ САЛБАР ТУС БҮРЭЭР

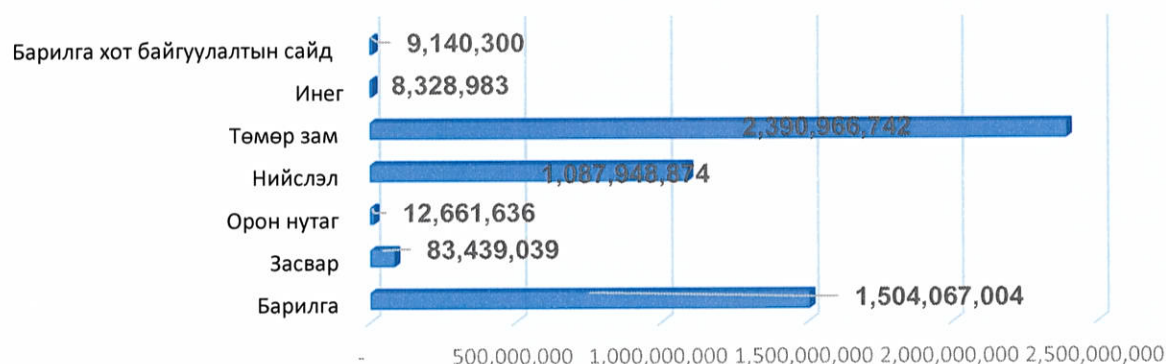

ЗУРГАА. ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.2, 8.9.5, 8.9.8-д заасны дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2024 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх завсрын аудитын ажил эхэлж “Авто замын норм, нормативын сан”-гийн 2024 эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалт, баримтын бүрдэлд Монгол Улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Авто замын тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, заавар журмын хэрэгжилт, ерөнхий шаардлага стандарт, улсын байцаагчийн эрх үүргийн хүрээнд 2024 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ны хугацаанд аудитын түүвэрт хамрагдаж хяналт, шалгалт, дотоод аудит хийгдсэн.

--oOo--

ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ХҮСНЭГТ №1

Он дамжсан 46 төсөл, арга хэмжээ					
№	Төсөл, арга хэмжээ	Гүйцэтгэгч	Дүн сая ₮	Явц	Хэрэгжилт
Бүрэн дууссан 15 төсөл					
1	“Авто зам, замын байгууламжийн төсөв бодоход хэрэглэх ажилчдын цагийн тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн боловсруулах	"Монголын авто замчдын холбоо" ТББ	132,275,000	100%	Зам, тээврийн Сайдын 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/243 дугаар тушаалаар батдагдаж. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны эрх зүйн баримт бичгийн актад 4457 дугаарт бүртгүүлэв.
2	“Авто зам, замын байгууламжийн машин, механизмын ашиглалтын нэг машин цагийн үнэ” шинэчлэн боловсруулах				
3	Авто замын төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг тооцох аргачлал боловсруулах	"Интегрити инженеринг" ХХК	186,237,512	100%	Ажлын даалгаварт заасан үүргийн биелэлт бүрэн хэрэгжсэн бөгөөд батлуулахаар аргачлалын төслийг Зам, тээврийн яамны Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.
4	MNS 6444:2014 “Сургуулийн бүс. Техникийн ерөнхий шаардлага” стандартыг шинэчлэх	"Ай Си Си Рөүд" ХХК	20,000,000	100%	Стандарт хэмжил зүйн газрын 2024 оны С/18 дугаар тушаалаар батлагдсан.
5	Хурд сааруулагчийн жишиг зургийн цомог боловсруулах	"Ай Си Си Рөүд" ХХК	20,000,000	100%	Стандарт хэмжил зүйн газрын 2024 оны С/18 дугаар тушаалаар батлагдсан.
6	Авто тээврийн хэрэгсэлд байрлуулах RFID шошгоны тухай стандарт боловсруулж, батлуулах	"ММЗөвлөх инженерүүдийн холбоо" ТББ	19,700,000	100%	Стандарт хэмжил зүйн газрын Харилцаа холбооны стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн.
7	MNS 6278:2011 “Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага” стандартыг шинэчлэн боловсруулах	"Зам тээврийн хүрээлэн" НҮТББ	20,000,000	100%	Эцсийн төслийг Стандарт хэмжил зүйн газрын Стандарчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.
8	MNS 4598:2020 "Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах		15,000,000	100%	Эцсийн төслийг Стандарт хэмжил зүйн газрын Стандарчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.
9	MNS 5345:2011 "Овор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага"		20,000,000	100%	Эцсийн төслийг Стандарт хэмжил зүйн газрын Стандарчиллын техникийн хороогоор

Он дамжсан 46 төсөл, арга хэмжээ					
№	Төсөл, арга хэмжээ	Гүйцэтгэгч	Дүн сая ₮	Явц	Хэрэгжилт
	стандартыг шинэчлэн боловсруулах				хэлэлцэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.
10	Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах шинэ техник, технологийн стандарт боловсруулах	"Авто тээврийн үндэсний төв"	21,200,000	100%	Эцсийн төслийг Стандарт хэмжил зүйн газрын Стандарчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.
11	ISO39001:2012 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх судалгаа	"Удирдах хөгжил урлаг"ТББ	19,900,000	100%	Зөвлөхийн боловсруулсан эцсийн тайланг акт үйлдэн хүлээн авахаар ажиллаж байна.
12	Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс ялгарах хорт хийн (CO, HC, NOx, PM болон бусад) агууламжийг хянах тогтолцоог боловсронгуй болгох судалгаа	"ШУТИС-Механик, тээврийн сургууль"	175,000,000	100%	Эцсийн төслийг Зам тээврийн яамны Автотээврийн салбарын Шинжлэх ухаан технологийн дэд зөвлөлийн 2024 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн бөгөөд гэрээт ажлын хүрээнд худалдан авсан багаж, тоног төхөөрөмжийг акт үйлдэн хүлээн авсан.
13	Олон улс, улсын чанартай авто замд баригдсан ус зайлуулах байгууламжид үзлэг судалгаа хийж, шар усны үер, гадаргуун ус нэвтрүүлэх чадварыг шинэчлэн тооцох судалгаа (1-р судалгааны зам: A0201-A0202 чиглэл)	"Keapo" ХХК	93,170,484	100%	Судалгааны ажлын эцсийн төслийг Зам, тээврийн яамны Авто замын салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн дэд зөвлөлийн 2024 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.
14	Тоосжилт ихтэй болон эвдрэл их үүсдэг давааны хучилтгүй хөрсөн хэсгийг тусгай барьцалдуулагч бодисоор бэхжүүлэх туршилт, судалгаа /Тэрэлж../	"Ай Руд" ХХК	294,137,910	100%	Судалгааны тайланг Авто замын салбарын Шинжлэх ухаан техникийн зөвлөлийн хурал болон Зам тээврийн яамны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.
15	"Монгол Улсын авто замын орон зайн мэдээллийн санд суурилсан веб аппликейшнд улсын чанартай авто замын судалгааны мэдээллийг оруулах, вэб аппликейшнг мэргэжлийн хэрэглээний	"Азийн дэд бүтцийн хөгжлийн судалгааны хүрээлэн" ТББ	181,800,000	95%	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд гүйцэтгэсэн эцсийн төслийг Авто замын салбарын Шинжлэх ухаан техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн

Он дамжсан 46 төсөл, арга хэмжээ					
№	Төсөл, арга хэмжээ	Гүйцэтгэгч	Дүн сая ₮	Явц	Хэрэгжилт
	түвшинд ашиглах дадлагыг бий болгох, олон улсын стандартын түвшинд нэгдсэн мэдээллийн системийг бий болгох" төслийн үр дүнг хэрэглээнд нэвтрүүлэх				дэмжигдсэн ба тус газрын захирлын баталсан тушаалын дагуу хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулагдаж ажлын хэсгийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авав. Гэрээний дагуу баталгаат хугацаанд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан гүйцэтгүүлж байна.
Батлагдах шатанд 1 төсөл					
1	БНБД 32-01-04 "Хот суурины гудамж, зам төсөллөлт"-г шинэчлэн боловсруулах	"Гео зураглал" ХХК,	53,955,000	90%	Нормыг шинэчлэх ажлын даалгаврыг 2018 онд боловсруулсан ба сангийн төлөвлөгөөнд тусган батлуулж, тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулан гэрээг 2019.02-р сард байгуулсан. Шинэчилсэн төсөл 2021.08.20-нд Авто замын салбарын ШУТЗ-өөр дэмжигдсэн. Сайдын тушаалаар батлуулах хүсэлтийг 2021 оны 1/628 тоотойр 3ТХЯаманд хүргүүлсэн. 3ТХЯ-аас 2023.01-сард 01/369 тоотойр хуучин 2004 оны нормыг хүчингүй болгуулах хүсэлтийг БХБЯ-руу хүргүүлсэн. БХБЯ-аас МУЗГ-ын 2019 оны 106 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилгын тогтолцоо"-ны шаардлагыг хангуулахаар буцаагаад байгаа.
Дуусах шатанд 7 төсөл					
1	АЗУАГН 2.01.01-2004 "Авто замын уур амьсгал геотехникийн нөхцөл" нормыг шинэчлэн боловсруулах	"Саго трейд" ХХК	46,000,000	90%	Эцсийн төслийг Авто замын салбарын ШУТЗ-өөр хэлэлцүүлж, хурлаас гарсан зөвлөмжийн дагуу нормын төсөлд нэмэлт сайжруулалт хийж дахин хурлаар хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна.
Эцсийн шатанд 18 төсөл					
1	Асфальтбетон хучилтын геотор материалын техникийн шаардлага боловсруулах	"Жи Эс Эл Интернэшнл Консалтинг" ХХК	20,000,000	80%	Редакц, шүүмжийн ажлын хэсгээс гаргасан санал, зөвлөмжийн дагуу эцсийн шатны тайланд засвар сайжруулалтыг гүйцэтгэж байна.

Он дамжсан 46 төсөл, арга хэмжээ					
№	Төсөл, арга хэмжээ	Гүйцэтгэгч	Дүн сая ₮	Явц	Хэрэгжилт
2	"Авто зам, замын байгууламжийн нормативт хугацааны суурь норм"-ыг шинэчлэх	"Монголын авто замчдын холбоо" ТББ	85,800,000	80%	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын эцсийн шатны тайланд редакц, шүүмжийн санал дүгнэлтийн дагуу сайжруулалтыг гүйцэтгэж байна.
3	Гүүр барих нормативт хугацааг шинэчлэн боловсруулах				
4	Авто зам, гүүрийн барилга, засвар арчлалтын ажлын үе шатны ажлуудад ноогдох ИТА-ны цагийн томсгосон норм боловсруулах				
5	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжийн асуудал буюу налуу замын жишиг зургийн цомог боловсруулах	"Монголиан Нэйшнл Хайвэй" ХХК	20,000,000	80%	Зөвлөх үйлчилгээний эхлэлийн шатны тайланд Редакци, шүүмжийн ажлын хэсгээс гаргасан санал зөвлөмжийн дагуу эцсийн шатны тайланд засвар сайжруулалтыг гүйцэтгэж байна.
6	Гүүрийн алгасал байгууламжийг тооцоот ачаалал (статик & динамик) - р туршиж баталгаажуулах гарын авлага боловсруулах	"Брос проперти" ХХК	18,000,000	80%	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
7	Төмөрбетон хийцийн хэв хашмал & тулаасны гарын авлага боловсруулах	"Брос проперти" ХХК	16,000,000	80%	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
8	Гүүрийн хэв гажилтын заадас, тулах хэсэг, хүчитгэлийн тросс, хүчитгэлийн зайлшгүй дагалдах хэрэгсэлүүдэд тавигдах шаардлага боловсруулах	"Брос проперти" ХХК	15,000,000	80%	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
9	Авто замын зэргэлдээх нутаг дэвсгэрийг тээврийн хэрэгслээс үүсэх дуу чимээнээс хамгаалах аргачлал боловсруулах	"Гео урбан консалтинг" ХХК	35,500,000	80%	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
10	Аюулгүйн тойрог төлөвлөх аргачлал боловсруулах	"Гео урбан консалтинг" ХХК	34,394,400	80%	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
11	AASHTO R 28:2022 Даралтаар өгөршүүлэх багаж (PAV) ашиглан битумын өгөршлийг түргэсгэх аргын стандартыг шинэчлэн боловсруулах	"Монголиан Нэйшнл Хайвэй" ХХК	14,916,000	80%	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
12	ASTM D 4429 "Талбайн ачаа даац тодорхойлох" туршилтын стандартыг орчуулан боловсруулах	"Монголиан Нэйшнл Хайвэй" ХХК	10,065,000	80%	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
13	ASTM E 2835-11 "Хөнгөн ачаатай дефлектометр" стандартыг орчуулан боловсруулах	"Монголиан Нэйшнл Хайвэй" ХХК	19,228,000	80%	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.

Он дамжсан 46 төсөл, арга хэмжээ					
№	Төсөл, арга хэмжээ	Гүйцэтгэгч	Дүн сая ₮	Явц	Хэрэгжилт
14	Шилэн мяндасаар хүчитгэсэн халуун асфальтбетон хольцыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх туршилт, судалгаа	"Жи Эс Эл Консалтинг" ХХК	20,000,000	80%	Эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
15	Wetsort материалыг зам барилгын ажилд хэрэглэх, технологийг нэвтрүүлэх судалгаа	"Лабo" ХХК	15,000,000	80%	Редакц шүүмжийн ажлын хэсгээс гарсан санал дүгнэлтийн дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
16	Нано бактерийн судалгаа	"Смарт лаб" ХХК	16,000,000	80%	Редакц шүүмжийн ажлын хэсгээс гарсан санал дүгнэлтийн дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
17	TERRA-4000 бэхжүүлэгч материалыг зам барилгын ажилд хэрэглэх туршилт судалгаа	"Смарт лаб" ХХК	20,000,000	80%	Редакц шүүмжийн ажлын хэсгээс гарсан санал дүгнэлтийн дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
18	Хот, суурин газрын гудамж замын зураг төсөл боловсруулах үнэ тогтоох суурь судалгаа /Тохижилт болон инженерийн байгууламж бүгд тооцогдоно/	"Шарк Танк" ХХК	20,000,000	80%	Эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
Дунд шатанд 9 төсөл					
1	"Монгол Улсын авто замын салбарын түүхэн хөгжил" ном бүтээх	Зөвлөх баг	40,000,000	60%	Дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд.
2	"Монголын авто зам 2009-2019" ном бүтээх		20,000,000	60%	Дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд.
3	ЗЗБНБД 22- 004- 2016 "Авто зам төсөллөх" нормыг шинэчлэн боловсруулах	"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК	139,780,310	60%	Дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд.
4	"Хучилтын тооцооны гарын авлага" норм боловсруулах			60%	
5	БНБД 32.02.11 "Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх" нормыг шинэчлэн боловсруулах	"ГБЭТ" ХХК	300,000,000	60%	Дунд шатны тайланд Редакц, шүүмжийн ажлын хэсгээс гаргасан санал, зөвлөмжийн дагуу шаардлагатай нэмэлт сайжруулалтыг гүйцэтгэж байна. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгаа асуудлаар Зөвлөхөөс хүсэлт ирүүлээд байгаа тул судалж, шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.

Он дамжсан 46 төсөл, арга хэмжээ					
№	Төсөл, арга хэмжээ	Гүйцэтгэгч	Дүн сая ₮	Явц	Хэрэгжилт
6	"Модон гүүрийн барилгын ажлын төсвийн жишиг норм", "Ган гүүрийн барилгын ажлын төсвийн жишиг норм" боловсруулах	"Монголын авто замчдын холбоо" ТББ	100,000,000	60%	Дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
7	НАСТО олон улсын байгууллагын гаргадаг "Хотын тээврийн сүлжээний төлөвлөлтийн гарын авлага"-г шинээр боловсруулах	"Брос проперти" ХХК	30,439,200	60%	Дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
8	"Монгол орны асфальтбетон хучлагатай авто замын хучилтын хийцийн жишиг цомог" шинэчлэх.	"Ай Си Си Рөүд" ХХК	87,760,035	60%	Дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
9	Цэвдэгт бүс нутагт баригдсан авто замын өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох судалгаа	"Гео урбан консалтинг" ХХК	99,991,040	60%	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн дунд шатны тайланд редакц шүүмж хийх ажлын хэсгийг байгуулахаар ажиллаж байна.

Шинээр хэрэгжих 49 төсөл арга хэмжээ					
№	Төсөл, арга хэмжээ	Гүйцэтгэгч	Дүн сая ₮	Явц	Хэрэгжилт
Эхлэлийн шатанд 1 төсөл					
1	"1520 мм царигтай төмөр замын зам" стандартыг боловсруулах.	"Мөнгөн зөрлөг" ХХК	49,000,000	30%	Гэрээний дагуу эхлэлийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
Дунд шатанд 31 төсөл /3 багц-21 стандарт/					
1	"Гэрлэн дохио суурилуулах, засварлах, арчлах ажлын үйлдвэрлэлийн болон төсвийн жишиг норм" шинэчлэн боловсруулах	"Монголын авто замчдын холбоо" ТББ	40,000,000	60%	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
2	Гудамж замын гадаргуун ус зайлуулах байгууламжийн бүтээцийн жишиг зургийн цомог боловсруулах	"Ай Си Си Рөүд" ХХК	62,000,000	60%	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
3	"Төмөрбетон гүүрийн нарийвчилсан үзлэг, оношилгоо хийх заавар"-ыг шинэчлэн боловсруулах	"Ай Си Си Рөүд" ХХК	51,900,000	60%	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн дунд шатны тайланд редакц шүүмж хийх ажлын хэсгийг байгуулахаар ажиллаж байна.
4	"Гүүрэн байгууламжид арчлалт засвар хийх гарын авлага"-ыг шинэчлэн боловсруулах	"Ай Си Си Рөүд" ХХК	64,700,000	60%	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн дунд шатны тайланд редакц шүүмж хийх ажлын хэсгийг байгуулахаар ажиллаж байна.
5	"Гүүрийн хяналтын инженерийн гарын авлага"-ыг шинээр боловсруулах	"Ай Си Си Рөүд" ХХК	64,800,000	60%	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
6	"Явган хүний нийлмэл гүүр төсөллөх" нормыг шинээр боловсруулах	"Ай Си Си Рөүд" ХХК	49,900,000	60%	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
7	Нэг түвшний уулзвар ба огтлолцлыг төсөллөхөд тавигдах шаардлага	"Аттовэй дизайн" ХХК	164,313,000	60%	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн дунд шатны тайланд редакц шүүмж хийх ажлын хэсэгт хянагдсаны дагуу засавар сайжруулалт хийгдэж байна.
8	Зорчигч тээврийн нэр бүхий 9 стандартыг шинэчлэн боловсруулах	"ММЗөвлөх инженерүүдийн холбоо" ТББ	30,000,000	60%	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
9	Ачаа тээврийн нэр бүхий 6 стандартыг шинэчлэн боловсруулах	ШУТИС-Бизнесийн ахисан түвшний сургууль	30,000,000	60%	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
10	ISO 16844-1-4:2022, ISO 16844-6-7:2022 Road vehicles-багц нэр бүхий 6 стандартыг шинээр боловсруулах	"ММЗөвлөх инженерүүдийн холбоо" ТББ	60,000,000	60%	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.

Шинээр хэрэгжих 49 төсөл арга хэмжээ					
№	Төсөл, арга хэмжээ	Гүйцэтгэгч	Дүн сая ₮	Явц	Хэрэгжилт
11	"Хүйтэн асфальтбетон хольц. Техникийн шаардлага" боловсруулах	"Шарк Танк" ХХК	17,000,000	60%	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
12	Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээ болон техникийн хяналтын үзлэгийн үйл ажиллагаанд даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх судалгаа	"ШУТИС-Бизнесийн ахисан түвшний сургууль"	40,000,000	60%	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
13	Мэдээлэлийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо бүрдүүлэх зөвлөх үйлчилгээ	"Монголын кибер довтолгоотой тэмцэх төв" ТББ	94,800,000	60%	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
Эцсийн шатанд 5 төсөл					
1	ЗЗБНБД 81-013-2019 "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм"-ыг шинэчлэн боловсруулах	"Монголын авто замчдын холбоо" ТББ	98,500,000	80%	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
2	"Авто зам, замын байгууламжийн барилга, шинэчлэлт, их засварын техник-эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ) ба техник-эдийн засгийн тооцоолол (ТЭЗТ) боловсруулах, тэдгээрийн чанарыг үнэлэх, хүлээн авах, батлах заавар" боловсруулах	Монгол Улсын Зөвлөх инженер Р.Балжир	17,000,000	80%	Баримт бичгийн эцсийн төслийг танилцуулж, санал авахаар Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захирагааны төв байгууллагууд хүргүүлэн хамтран ажиллаж байна.
3	MNS ASTM D3910:2008 "Сларри сийл-ийг төсөллөх, турших ба барих үед хэрэглэх заавар" стандартыг шинэчлэн боловсруулах	"Шарк Танк" ХХК	19,900,000	80%	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн эцсийн шатны тайланд редакц шүүмж хийх ажлын хэсэгт хянагдаж байна.
4	ASTM D 4215-21 "Хүйтэн асфальтбетон хольц" стандартыг боловсруулах	"Шарк Танк" ХХК	19,000,000	80%	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн эцсийн шатны тайланд редакц шүүмж хийх ажлын хэсэгт хянагдаж байна.
5	Зам, тээврийн салбарын нэгдсэн платформоор дамжуулж, их өгөгдлийг үүсгэх, олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэх портал сайт хөгжүүлэлт	"Интерактив" ХХК	94,875,500	80%	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.
Сонирхогч этгээдийн тоо хуулийн шаардлагад нийцээгүй, тендер амжилтгүй болж дахин зарласан 5 төсөл					
1	ЗЗБНБД 84-021-2016 "Авто зам, гүүрийн арчлалт, засварын ажлын зардлын суурь норм"-ыг шинэчлэн боловсруулах	-	42,000,000	-	Тендерийн шатанд
2	ЗЗБНБД 31-008-2016 "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага"-ыг шинэчлэх	-	123,600,000	-	Тендерийн шатанд

Шинээр хэрэгжих 49 төсөл арга хэмжээ					
№	Төсөл, арга хэмжээ	Гүйцэтгэгч	Дүн сая ₮	Явц	Хэрэгжилт
3	"Ус зайлуулах байгууламжийн загвар гарын авлага" боловсруулах	-	145,000,000	-	Тендерийн шатанд
4	Олон улс, улсын чанартай авто замд баригдсан ус зайлуулах байгууламжид үзлэг судалгаа хийж, шар усны үер, гадаргуун ус нэвтрүүлэх чадварыг шинэчлэн тооцох судалгаа (Налайх-Чойр-Сайншанд 2-р судалгааны зам: А0101, А0102, А0103 чиглэл)	-	138,847,500	-	Тендерийн шатанд
5	Монгол Улсын төмөр замын тээврийн тариф тогтоох аргачлал боловсруулах	-	580,000,000	-	Зам, тээврийн яамны ТНБД-ын баталсан Ажлын даалгаврын хүрээнд Үнэлгээний хороо сонгон шалгаруулалтын ТББ боловсруулж байна. Төмөр зам далайн тээврийн бодлого зохицуулалтын газраас санал авч батлуулснаар сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.
Ажлын даалгавар шинэчлэх, батлуулахтай холбогдуулан нэмэлт судалгаа хийгдэж зарлагдаагүй байгаа 5 төсөл					
1	"Авто зам, замын байгууламжийн магадлашгүй ажлын зардлыг тооцож олгох журам" боловсруулах	-	18,850,000	-	Ажлын даалгаварт Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас санал авч батлуулснаар сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.
2	"Авто зам, замын байгууламжид хэрэглэх материалуудын нэгж хүнд, ачааны зэрэг, хорогдолыг тодорхойлох заавар" боловсруулах	-	50,000,000	-	Ажлын даалгаварт Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас санал авч батлуулснаар сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.
3	"Авто зам, гүүрийн зураг төсөл, хайгуулын ажлын жишиг үнэ тооцох аргачлал"-ыг шинэчлэн боловсруулах	-	50,000,000	-	Ажлын даалгаварт Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас санал авч батлуулснаар сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.
4	Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний үнийн тохируулга хийх нөхцөл, аргачлал боловсруулах	-	50,000,000	-	Ажлын даалгаварт Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас санал авч батлуулснаар сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.
5	Шугаман байгууламж (Авто зам, Төмөр зам)-ийн ус зүйн болон гидравликийн тооцооллыг тооцох арга,	-	50,000,000	-	Ажлын даалгаварт Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас санал авч

	аргачлалыг шинэчлэх, боловсронгуй болгох суурь судалгаа				батлуулснаар сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.
6	"Авто зам, замын байгууламжийн уян хучлагын дүрэм"-ийг дагаж мөрдөгдөх багц-26 стандарт боловсруулах	-	200,000,000	-	Ажлын даалгаварт Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас санал авч батлуулснаар сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.

---oOo---

"АВТО ЗАМЫН НОРМ НОРМАТИВЫН САН"-ГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2024-2025 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГЭРЭЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2025 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

Нэг. Он дамжин шилжиж байгаа төсөл, арга хэмжээ										
№	Төсөл, арга хэмжээний чиглэл, нэр	Гэрээний дүн, ₮	Өмнө олгосон дүн, ₮	2024-2025 онд олгох дүн, ₮	Санхүүжилт		Хэрэгжүүлэх байгууллага, гэрээ №	Явц	Төрөл	
1.1 Норм норматив, техникийн баримт бичиг										
1.1.1	БНБД 32-01-04 "Хот суурины гудамж, зам төсөллөлт"-г шинэчлэн боловсруулах	53,955,000	48,559,500	5,395,500	-		"Гео зураглал" ХХК, 2019/14	Нормыг шинэчлэх ажлын даалгаврыг 2018 онд боловсруулсан ба сангийн төлөвлөгөөнд тусган батлуулж, тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулан гэрээг 2019.02-р сард байгуулсан. Шинэчилсэн төсөл 2021.08.20-нд Авто замын салбарын ШУТЗ-өөр дэмжигдсэн. Сайдын тушаалаар батлуулах хүсэлтийг 2021 оны 1628 тоотойр 3ТХЯ-аманд хүргүүлсэн. 3ТХЯ-аас 2023.01-сарад 01/369 тоотойр хуучин 2004 оны нормыг хүчингүй болтуулах хүсэлтийг БХБЯ-руу хүргүүлсэн. БХБЯ-аас МУЗГ-ын 2019 оны 106 дугаар тоотойр батлагдсан "Барилгын тогтолцоо"-ны шаардлагыг хангуулах чиглэл ирсэн. Чиглэлийн дагуу БХБЯ-тай ажлын даалгаврыг хамтран батлуулах, БХТөөөөс шинэчилсэн нормын төсөлд санал авч ажиллаж байна. Гэрээ, Ажлын даалгаварт заасан үүргийн биелэлт бүрэн хэрэгжсэн ба баталгаажуулах асуудлаар Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.	Батлагдах шатанд	Норм
1.1.2	АЗУАНГ 2.01.01-2004 "Авто замын уур амьсгал геотехникийн нөхцөл" нормыг шинэчлэн боловсруулах	46,000,000	41,400,000	4,600,000	-		"Саго трейд" ХХК 2020/331	Авто замын салбарын Шинэлэх ухаан, техникийн зөвлөлийн хурлаас гарсан зөвлөмжийн дагуу Монгол Орны 1. Авто замын уур амьсгалын бүс, дэд бүсчлэл дэх сарын, хоногийн болон өдрийн агаарын дундаж температур; 2. Авто замын уур амьсгалын бүс, дэд бүсчлэл дэх сарын хур тунадасны дундаж хэмжээ, аадар борооны давтамж /олон жилийн дунджаар болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр өөрчлөгдсөн дундаж үзүүлэлт/ 3. Авто замын уур амьсгалын бүс, дэд бүсчлэл дэх хөрсний чийгийн дундаж үзүүлэлт /сараар/, хөрсний хөдөлтийн дундаж гүн; 4. Авто замын уур амьсгалын бүс, дэд бүсчлэл дэх хөрсний чийгийн дундаж үзүүлэлт /сараар/, чийгийн эх сурвалж. Дундаж мэдээллийг нэмэлт судалгаа хийж байна. Мөн тус сангийн хөрөнгөөр боловсруулж буй "Авто замын уур амьсгалын төсөллөх дүрэм"-ийн шинэчлэлттэй уялдуулан ажиллаж байна. Ажлын даалгаварт заасан үүргийн биелэлт бүрэн хангагдсан бөгөөд ШУТЗ-өөс өгсөн зөвлөмжийн мөреэр шаардлагатай арга хэмжээг Ус зүй цаг уур хүрээлэнгийн газар болон Геофизикийн хүрээлэнгтэй хамтран ажиллаж байна.	Дуусах шатанд	Норм
1.1.3	"Монгол Улсын авто замын салбарын түүхэн хөгжил" ном бүтээх	40,000,000	12,000,000	28,000,000	-		Зөвлөх баг, 2022/490, 491	Энэхүү ном нь Авто замын салбарын үе үеийн түүхэн хөгжлийг өгүүлсэн байх бөгөөд Номын төслийг хянан тохиолдуулж байгаа ба нэмэлт архивын судалгаа хийгдэж байна. Авто замын салбарын 95 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд нэмэлт баяжуулалт, сурвалжлага хийхээр ажиллаж байна. Гэрээний үүрэг хангагдсан боловч Захиалагчаас нэмэлт судалгаа хийх чиглэл өгсөний дагуу нэмэлт боловсруулалт хийгдэж байна.	Дунд шатанд	Норм
1.1.4	"Монголын авто зам 2009-2019" ном бүтээх	20,000,000	6,000,000	14,000,000	-			Дунд шатанд	Норм	
1.1.5	33БНБД 22- 004- 2016 "Авто зам төсөллөх" нормыг шинэчлэн боловсруулах	139,780,310	27,956,062	111,824,248	-		"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2021/174	Зөвлөх байгууллагаас авто замын төсөллөлтийн үндсэн нормыг шинэчлэн боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний хүрээндээ салбарын стандарт норм дүрмийн тогтолцоог шинэчлэх саналыг дэвшүүлж, улмаар MNS 6598:2016 "Зам, замын байгууламжийн норматив техникийн баримт бичгийн өрөнхий тогтолцоо"-ны стандартыг шинэчлэн Авто замын салбарын стандартчлалын техникийн хороогоор батлуулсан. Батлагдсан тогтолцооны стандартын дагуу Авто замын төсөллөлтийн баримт бичгийн иж бүрдлийг бий болгох, гэрээний хүрээнд 16 баримт бичгээс 8 баримт бичиг боловсруулахаар тогтсон. Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас дээрх зураг төслийн баримт бичгийн иж бүрдэлд эцэслэн санал, шийдвэр гаргуулахаар ажиллаж байна. Шийдвэр гарснаар гэрээг дүгнэж, сунган ажиллах болно.	Дунд шатанд	Норм
1.1.6	"Хучилтын тооцооны гарын авлага" норм боловсруулах							Дунд шатанд	Норм	
1.1.7	Асфальт-бетон хучилтын геостор материалын техникийн шаардлага боловсруулах	20,000,000	10,000,000	10,000,000	6,000,000		Жи Эс Эл Интернашл Консалтинг ХХК, 2023/03-10	Гэрээг ажлын хүрээнд боловсруулсан дунд шатны тайланд Редац, шүүмжийн ажлын хэсгээс гаргасан санал, зөвлөмжийн дагуу зэсийн шатны тайланг боловсруулж байна. Зөвлөмжийн хэрэгжилттэй холбогдуулан нэмэлт гэрээ байгуулан хугацаа сунган ажиллаж байна.	Эцсийн шатанд	Норм
1.1.8	БНБД 32.02.11 "Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх" нормыг шинэчлэн боловсруулах	299,943,334	89,983,000	209,960,334	-		"ТБЭТ" ХХК 2023/03-07	Дунд шатны тайланд Редац, шүүмжийн ажлын хэсгээс гаргасан санал, зөвлөмжийн дагуу шаардлагатай нэмэлт сайжруулалтыг гүйцэтгэж байна. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгаа асуудлаар Зөвлөхөөс хүсэлт ирүүлээд байгаа тул судалж, шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.	Дунд шатанд	Норм

№	Төсөл, арга хэмжээний чиглэл, нэр	Гэрээний дүн, ₮	Өмнө олгосон дүн, ₮	Санхүүжилт		Хэрэгжүүлэх байгууллага, гэрээ №	Биелэлт	Явц	Төрөл
				2024-2025 онд олгох дүн, ₮	2024 онд олгосон	Үлдэгдэл			
1.1.9	"Авто зам, замын байгууламжийн нормативт хугацааны суурь норм"-ыг шинэчлэх	85,800,000	51,480,000	34,320,000	-	34,320,000	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын эцсийн шатны тайланд редакц, шүүмжийн ажлын хэсгээс гаргасан санал зөвлөмжийн дагуу шаардлагатай нэмэлт сайжруулалтыг гүйцэтгэж, Авто замын салбарын Шинжлэх ухаан технологийн дэд зөвлөл болон Зам тээврийн яамны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулах нэмэлт гэрээ байгуулан хугацаа сунган ажиллаж байна.	Эцсийн шатанд	Норм
1.1.10	Гүүр барих нормативт хугацааг шинэчлэн боловсруулах							Эцсийн шатанд	Норм
1.1.11	Авто зам, гүүрийн барилга, засвар арчлалтын ажлын үе шатны ажлуудад ноогдох ИТА-ны цагийн томьёосон норм боловсруулах							Эцсийн шатанд	Норм
1.1.12	"Авто зам, замын байгууламжийн төсөө бодоход хэрэглэх ажилчдын цагийн тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн боловсруулах	132,275,000	52,910,000	79,365,000	52,910,000	26,455,000	"Монголын авто замчдын холбоо" ТББ 2023/03-04	Бүрэн хэрэгжсэн	Норм
1.1.13	"Авто зам, замын байгууламжийн машин, механизмзын ашиглалтын нэг машин цагийн үнэ" шинэчлэн боловсруулах						"Монголын авто замчдын холбоо" ТББ 2023/03-05	Бүрэн хэрэгжсэн	Норм
1.1.14	"Модон гүүрийн барилгын ажлын төсвийн жишиг норм", "Тан гүүрийн барилгын ажлын төсвийн жишиг норм" боловсруулах	100,000,000	30,000,000	70,000,000	-	70,000,000	"Монголын авто замчдын холбоо" ТББ 2023/03-06	Дунд шатанд	Норм
1.1.15	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжийн асуудал буюу налуу замын жишиг зургийн цомог боловсруулах	20,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	"Монголын Нэйшнл Хайэйг" ХХК, 2022/626	Эцсийн шатанд	Норм
1.1.16	Хурд сааруулагчийн жишиг зургийн цомог боловсруулах	20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	"Ай Си Си Ревд" ХХК, 2022/578	Бүрэн хэрэгжсэн	Стандарт
1.1.17	Авто замын төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг тооцох аргачлал боловсруулах	186,237,512	111,742,507	74,495,005	74,495,005	-	"Интерприти инквенеринг" ХХК, 3ТХТ/202211043	Бүрэн хэрэгжсэн	Норм
1.1.18	Гүүрийн алгасал байгууламжийг тооцоот ачаалал (статик & динамик) -р туршиж баталгаажуулах гарын авлага боловсруулах	18,000,000	7,200,000	10,800,000	5,400,000	5,400,000	"Брос проперти" ХХК, 2023/03-57	Эцсийн шатанд	Норм
1.1.19	Темербетон хийцийн хэв хашмал & тулаасны гарын авлага боловсруулах	16,000,000	6,400,000	9,600,000	4,800,000	4,800,000	"Брос проперти" ХХК 2023/03-56	Эцсийн шатанд	Норм
1.1.20	Гүүрийн хэв гажилтын заадас, тулах хэсэг, хүчитгэлийн тресс, хүчитгэлийн зайлшгүй дагалдах хэрэгслүүдэд тавигдах шаардлага боловсруулах	15,000,000	6,000,000	9,000,000	4,500,000	4,500,000	"Брос проперти" ХХК 2023/03-58	Эцсийн шатанд	Норм
1.1.21	НАСТО олон улсын байгууллагын гаргадаг "Хотын тээврийн сүлжээний төлөвлөлтийн гарын авлага"-г шинээр боловсруулах	30,439,200	12,175,680	18,263,520	9,131,760	9,131,760	"Брос проперти" ХХК 2023/03-58	Дунд шатанд	Норм
1.1.22	"Монгол орны асфальтбетон хучлагатай авто замын хучилтын хийцийн жишиг цомог" шинэчлэх.	87,760,035	26,328,011	61,432,025	35,104,014	26,328,011	"Ай Си Си Ревд" ХХК, 3ТХТ/202305027	Дунд шатанд	Норм
1.1.23	Авто замын зэргэлдээх нутаг дэвсгэрийг тээврийн хэрэгслээс үүсэх дуу чимээгээс хамгаалах аргачлал боловсруулах	35,500,000	7,100,000	28,400,000	14,200,000	14,200,000	"Тео урбан консалтинг" ХХК, 3ТХТ/202305029	Эцсийн шатанд	Норм

№	Төсөл, арга хэмжээний чиглэл, нэр	Гэрээний дүн, ₮	Санхүүжилт			Хэрэгжүүлэх байгууллага, гэрээ №	Биелэлт	Явц	Төрөл
			Өмнө олгосон дүн, ₮	2024-2025 онд олгох дүн, ₮	2024 онд олгосон				
1.1.24	Аюулгүйн тойрог төлөвлөх аргачлал боловсруулах	34,394,440	6,876,888	27,515,552	13,757,776	"Гео урбан консалтинг" ХХК, ЗТХТ202305030	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Эцсийн шатанд	Норм
1.2	Стандарт	1,401,084,831	574,113,648	826,971,183	230,296,555				
1.2.1	MNS 5342:2007 "Авто зогсоол, Ангилал ба ерөнхий шаардлага" стандарт шинэчлэн боловсруулах	14,500,000	4,350,000	10,150,000	4,350,000	"Засмал зам" ХХК 2021/143	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Эцсийн шатанд	Стандарт
1.2.2	MNS 6444:2014 "Сургуулийн бүс. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэх	20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	"Ай Си Си Ред" ХХК, 2022/579	Гэрээт ажлын хүрээнд боловсруулсан стандартын төслийг Стандарт хэмжил зүйн газрын Авто замын салбарын стандарчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлж 2024 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн С/18 дугаар тушаалаар батлагдаж, Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан. Гэрээ, Ажлын даалгаварт заасан үүргийн биелэлт бүрэн хэрэгжсэн.	Бүрэн хэрэгжсэн	Стандарт
1.2.3	AASHTO R 28:2022 Даралтаар өгөршүүлэх багаж (PAV) ашиглан битумын өгөршлийг түргэтгэх аргын стандартыг шинэчлэн боловсруулах	14,916,000	5,966,400	8,949,600	-	"Монголиан Нэйшнл Хайвэй" ХХК 2023/03-35	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Эцсийн шатанд	Стандарт
1.2.4	ASTM D 4429 "Талбайн ачаа даац тодорхойлох" туршилтын стандартыг орчуулан боловсруулах	10,065,000	4,026,000	6,039,000	-	"Монголиан Нэйшнл Хайвэй" ХХК 2023/03-36	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Эцсийн шатанд	Стандарт
1.2.5	ASTM E 2835-11 "Хөнгөн ачаатай дефлектометр" стандартыг орчуулан боловсруулах	19,228,000	7,691,200	11,536,800	-	"Монголиан Нэйшнл Хайвэй" ХХК 2023/03-37	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Эцсийн шатанд	Стандарт
1.2.6	Авто тээврийн хэрэгсэлд байрлуулах RFID шошгоны тухай стандарт боловсруулж, батлуулах	19,700,000	11,820,000	10,780,000	10,780,000	"ММЗөвлөх инженерүүдийн холбоо" ТББ, 2022/511	Боловсруулсан стандартын төслийг Стандарт хэмжил зүйн газрын Харилцаа холбооны стандарчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэнээр 2024 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн С/22 дугаар тушаалаар MNS 7044:2024 шифр дугаартай стандарт батлагдсан. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан. Гэрээ, Ажлын даалгаварт заасан үүргийн биелэлт бүрэн хэрэгжсэн.	Бүрэн хэрэгжсэн	Стандарт
1.2.7	Автозвэррийн хэрэгсэл. Техникийн байдалд тавигдах аюулгүй ажиллагааны шаардлага ба шалгах арга ГОСТ р 51709-2001 стандарт боловсруулах	15,000,000	4,500,000	10,500,000	-	"Замын тээврийн иргэний зөвлөл" НУТББ 2023/03-79	Зөвлөх байгууллагаас гэрээт хугацаанд дүнд шатны тайланг ирүүлзгүй, танилцуулаагүй тул Захиалагчийн зүгээс гэрээт цуцлах шийдвэр гаргаж, энэ тухай мэдэгдлийг 2024-06-26-ны өдрийн 02/809 дугаар албан бичгээр Зөвлөхөд хүргүүлсэн. Гэрээний дагуу шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллаж байна.	Эхлэлийн шатанд	Стандарт
1.2.8	MNS 6278:2011 "Хүнд даацан автозвэррийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах	20,000,000	0	20,000,000	12,000,000	"Зам тээврийн хүрээлэн" НУТББ 2023/03-167	Эцсийн төслийг Стандарт хэмжил зүйн газрын Стандарчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.	Бүрэн хэрэгжсэн	Стандарт

№	Төсөл, арга хэмжээний чиглэл, нэр	Гэрээний дүн, ₮	Өмнө олгосон дүн, ₮	Санхүүжилт		Хэрэгжүүлэх байгууллага, гэрээ №	Биелэлт	Явц	Төрөл
				2024-2025 онд олгох дүн, ₮	2024 онд олгосон	Үлдэгдэл			
1.2.9	MNS 4598:2020 "Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах	15,000,000	0	15,000,000	9,000,000	1,832,318	"Зам тээврийн хүрээлэн" НҮТБ 2023/03-166	Эцсийн төслийг Стандарт хэмжил зүйн газрын Стандарчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.	Стандарт
1.2.10	MNS 5345:2011 "Овор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах	20,000,000	0	20,000,000	12,000,000	8,000,000	Зам тээврийн хүрээлэн НҮТБ 2023/03-165	Эцсийн төслийг Стандарт хэмжил зүйн газрын Стандарчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.	Стандарт
1.2.11	Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах шинэ техник, технологийн стандарт боловсруулах	21,200,000	19,080,000	2,120,000	-	2,120,000	"Авто тээврийн үндэсний төв" ХХК, 2020/332	Эцсийн төслийг Стандарт хэмжил зүйн газрын Стандарчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.	Стандарт
1.3	Судалгаа	189,609,000	67,433,600	125,075,400	58,130,000	52,277,718			
1.3.1	Цаадэгт бүс нутагт баригдсан авто замын өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох судалгаа	99,991,040	0	99,991,040	-	-	"Гео урбан консалтинг" ХХК ЗТХТ202305031	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн дунд шатны тайланд редац шүүмж хийх ажлын хэсгийг байгуулахаар ажиллаж байна.	Судалгаа
1.3.2	Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөрээс ялгарах хорт хийн (CO, HC, NOx, PM болон бусад) агууламжийг хянах тогтолцоог боловсронгуй болгох судалгаа	175,000,000	52,500,000	122,500,000	52,500,000	70,000,000	"ШУТИС-Механик, тээврийн сургууль" ЗТХТ202305035	Эцсийн төслийг Зам тээврийн яамны Автотээврийн салбарын Шинжлэх ухаан технологийн дэд зөвлөлийн 2024 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн бөгөөд гэрээт ажлын хүрээнд худалдан авсан багаж, тоног төхөөрөмжийг акт үйлдэн хүлээн авсан.	Судалгаа
1.3.3	Шилэн мяндаасар хүчигтгэсэн асфальтбетон хольцыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх туршилт, судалгаа	20,000,000	7,500,000	12,500,000	7,500,000	5,000,000	"Жи Эс Эл Консалтинг" ХХК, 2023/03-11	Эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна. Редакци, шүүмжийн Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилттэй холбогдуулан нэмэлт гэрээ байгуулан хугацаа сунган ажиллаж байна.	Судалгаа
1.3.4	Wetsort материалыг зам барилгын ажилд хэрэглэх, технологийг нэвтрүүлэх судалгаа	15,000,000	6,000,000	9,000,000	4,500,000	4,500,000	"Лабс" ХХК 2023/03-126	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн эцсийн шатны тайланд редац шүүмж хийх ажлын хэсгийг байгуулахаар ажиллаж байна.	Судалгаа
1.3.5	Нано бактерийн судалгаа	16,000,000	4,800,000	11,200,000	4,800,000	6,400,000	"Смарт лаб" ХХК 2023/03-124	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн эцсийн шатны тайланд редац шүүмж хийх ажлын хэсгийг байгуулахаар ажиллаж байна.	Судалгаа
1.3.6	TERRA-4000 бэхжүүлэх материалыг зам барилгын ажилд хэрэглэх туршилт судалгаа	20,000,000	8,000,000	12,000,000	6,000,000	6,000,000	"Смарт лаб" ХХК 2023/03-125	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн эцсийн шатны тайланд редац шүүмж хийх ажлын хэсгийг байгуулахаар ажиллаж байна.	Судалгаа
1.3.7	ISO38001:2012 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх судалгаа	19,900,000	5,970,000	13,930,000	13,930,000	-	"Удирдах хөгжил урлаг" ТББ 2023/03-128	Судалгааны ажлын тайланг акт үйлдэн хүлээн авсан. Гэрээ, Ажлын dealгаварт заасан үүргийн биелэлт бүрэн хэрэгжсэн.	Судалгаа
1.3.8	Хот, суурин газрын гудамж замын зураг төсөл боловсруулах үнэ тогтоох суурь судалгаа /Тохижилт болон инженерийн байгууламж бүгд тооцогдоно/	20,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	"Шарк Танк" ХХК 2023/03-175	Эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна. Редац, шүүмжийн Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилттэй холбогдуулан нэмэлт гэрээ байгуулан хугацаа сунгахаар ажиллаж байна.	Судалгаа
1.3.9	Олон улс, улсын чанартай авто замд баригдсан ус зайлуулах байгууламжид үзлэг судалгаа хийж, шар усны үер, гадаргуун ус нэвтрүүлэх чадаврыг шинэчлэн тооцох судалгаа (1-р судалгааны зам: А0201-А0202 чиглэл)	93,170,484	27,951,145	65,219,339	65,219,339	-	"Кеарс" ХХК, ЗТХТ202305036	Судалгааны ажлын эцсийн төслийг Зам, тээврийн яамны Авто замын салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн дэд зөвлөлийн 2024 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.	Судалгаа
1.3.10	Тоосжилт ихтэй болон зөдрэл их үүсдэг давааны хүчилтгүй хөрсөн хэсгийг тусгай барьцандуулагч Бодисоор бэхжүүлэх туршилт, судалгаа /Гэрэл./	294,137,910	235,310,328	58,827,582	58,827,582	-	"Ам Ройд" ХХК, 2022/156	Судалгааны тайланг Авто замын салбарын Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурал болон Зам тээврийн яамны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. Гэрээт ажлыг акт үйлдэн хүлээн авсан.	Судалгаа

№	Төсөл, арга хэмжээний чиглэл, нэр	Гэрээний дүн, ₮	Өмнө олгосон дүн, ₮	2024-2025 онд олгох дүн, ₮	Санхүүжилт		Хэрэгжүүлэх байгууллага, гэрээ №	Биеэлэлт	Явц	Төрөл
1.3.11	"Монгол Улсын авто замын орон зайн мэдээллийн санд суурилсан веб аппликейшнд улсын чанартай авто замын судалгааны мэдээллийг оруулах, вэб аппликейшг мэргэжлийн хэрэглээний түвшинд ашиглах дадалгыг бий болгох, олон улсын стандартын түвшинд нэгдсэн мэдээллийн системийг бий болгох" төслийн үр дүнг хэрэглээнд нэвтрүүлэх	181,800,000	90,900,000	90,900,000	72,720,000	18,180,000	"Азийн дэд бүтцийн хөгжлийн судалгааны хүрээлэн" ТББ ЗТХТ202201041	Судалгааны ажлын эцсийн тайланг Авто замын салбарын Шинжлэх ухаан техникийн зөвлөлийн хурлаар 2024.04.18-ны өдөр хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. Захиалчаас томилогдсон Ажлын хэсэг акт үйлдэн хүлээн авсан. Гэрээний дагуу баталгаат хугацаанд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө гарган биеэллтийг хангуулан Веб сайт, аппликейшныг мэргэжлийн хэрэглээний түвшинд нэвтрүүлэхээр Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.	Бүрэн хэрэгжсэн	Судалгаа
		954,999,434	448,931,473	506,067,961	285,996,921	120,080,000				
		2,545,693,265	1,090,478,721	1,458,114,544	574,425,476	769,030,346				
Хоёр. 2024-2025 онд шинээр хэрэгжиж төсөл, арга хэмжээ										
2.1	Норм норматив, техникийн баримт бичиг									
2.1.1	33БНБД 81-013-2019 "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм"-ыг шинэчлэн боловсруулах	98,500,000	0	98,500,000	68,950,000	29,550,000	"Монголын авто замчдын холбоо" ТББ	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Эцсийн шатанд	Норм
2.1.2	33БНБД 84-021-2016 "Авто зам, гүүрийн арчлалт, засварын ажлын зардлын суурь норм"-ыг шинэчлэн боловсруулах	42,000,000	0	42,000,000	-	-	-	Төндөрийн сонгон шалгаруулалтыг 2 удаа зарласан. Сонирхогч этгээд оролцоогүй. Дахин зарлахаар ажиллаж байна.	Төндөрийн шатанд	Норм
2.1.3	33БНБД 31-008-2016 "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага"-ыг шинэчлэх	123,600,000	0	123,600,000	-	-	-	Төндөрийн сонгон шалгаруулалтыг 3 удаа зарласан. 2 удаа Сонирхогч этгээд оролцоогүй. 1 төндөрийн шатанд материал ирүүлсэн сонирхогч этгээдийн материал хангалтгүй хэмээн үнэлэгдсэн. Дахин зарлахаар ажиллаж байна.	Төндөрийн шатанд	Норм
2.1.4	"Тэрлэн дохио суурилуулах, засварлах, арчлах ажлын үйлдвэрлэлийн болон төсийн жишиг норм" шинэчлэн боловсруулах	40,000,000	0	40,000,000	12,000,000.0	28,000,000	"Монголын авто замчдын холбоо" ТББ	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Дунд шатанд	Норм
2.1.5	Гудамж замын гадаргуун ус зайлуулах байгууламжийн бүтээцийн жишиг зургийн цомог боловсруулах	62,000,000	0	62,000,000	18,600,000.0	43,400,000	"Ай Си Си Ревд" ХХК 2024-03-196	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Дунд шатанд	Норм
2.1.6	"Авто зам, замын байгууламжийн барилга, шинэчлэлт, их засварын техник-эдийн засгийн үндэслэл (ГЗЗТ) ба техник-эдийн засгийн тооцоолол (ГЗЗТ) боловсруулах, тэдгээрийн чанарыг үнэлэх, хүлээн авах, батлах заавар" боловсруулах	17,000,000	0	17,000,000	8,500,000	8,500,000	Р Балжир 2024/03-135	Баримт бичгийн эцсийн төслийг танилцуулж, санал авахаар Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагууд хүргүүлэн хамтран ажиллаж байна.	Эцсийн шатанд	Норм
2.1.7	"Ус зайлуулах байгууламжийн загвар гарын авлага" боловсруулах	145,000,000	0	145,000,000	-	-	-	Төндөрийн сонгон шалгаруулалтыг 2 удаа зарласан. Сонирхогч этгээд оролцоогүй. Дахин зарлахаар ажиллаж байна.	Төндөрийн шатанд	Норм
2.1.8	"Авто зам, замын байгууламжийн магадлалгүй ажлын зардлыг тооцож олгох журам" боловсруулах	18,850,000	0	18,850,000	-	-	-	Ажлын даалгаварт Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Салбарын төрийн бус байгууллагуудаас санал авч ажлын даалгаврыг эцэслэснээр сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.	-	Норм
2.1.9	"Авто зам, замын байгууламжид хэрэглэх материалуудын нэрж хүнд ачааны зэрэг, хорогдолыг тодорхойлох заавар" боловсруулах	50,000,000	0	50,000,000	-	-	-	Ажлын даалгаварт Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Салбарын төрийн бус байгууллагуудаас санал авч ажлын даалгаврыг эцэслэснээр сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.	-	Норм
2.1.10	"Авто зам, гүүрийн зураг төсөл, хайгуулын ажлын жишиг үнэ тооцох аргачлал"-ыг шинэчлэн боловсруулах	50,000,000	0	50,000,000	-	-	-	Ажлын даалгаварт Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Зураг төсөл боловсруулах эрх бүхий байгууллагуудаас санал авч ажлын даалгаврыг эцэслэснээр сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.	-	Норм
2.1.11	"Төмөрбөтөн гүүрийн нарийвчилсан үзлэг-оношилгоо хийх заавар"-ыг шинэчлэн боловсруулах	51,900,000	0	51,900,000	15,570,000	36,330,000	"Ай Си Си Ревд" ХХК 2024-03-129	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн дунд шатны тайланд редацц шүүмж хийх ажлын хэсгийг байгуулахаар ажиллаж байна.	Дунд шатанд	Норм
2.1.12	"Гүүрэн байгууламжид арчлалт засвар хийх гарын авлага"-ыг шинэчлэн боловсруулах	64,700,000	0	64,700,000	19,410,000	45,290,000	"Ай Си Си Ревд" ХХК 2024-03-128	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн дунд шатны тайланд редацц шүүмж хийх ажлын хэсгийг байгуулахаар ажиллаж байна.	Дунд шатанд	Норм
2.1.13	"Гүүрийн хяналтын инженерийн гарын авлага"-ыг шинээр боловсруулах	64,800,000	0	64,800,000	19,440,000	45,360,000	"Ай Си Си Ревд" ХХК 2024-03-131	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Дунд шатанд	Норм
2.1.14	"Явган хүний нийлмэл гүүр төсөллөх" нормыг шинээр боловсруулах	49,900,000	0	49,900,000	14,970,000	34,930,000	"Ай Си Си Ревд" ХХК 2024-03-130	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Дунд шатанд	Норм
2.1.15	Нэг түвшний уулзаар ба огтлолцлыг төсөллөхөд тааигдах шаардлага	164,313,000	0	164,313,000	49,293,900	115,019,100	"Аттовей дизайн" ХХК "Аварга зам" ХХК-ийн Түншлэл 2024/03-134	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн дунд шатны тайланд редацц шүүмж хийх ажлын хэсэгт хянагдаж байна.	Дунд шатанд	Норм
2.1.16	Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний үнийн тохируулга хийх нөхцөл, аргачлал боловсруулах	50,000,000	0	50,000,000	-	-	-	Ажлын даалгаварт Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Салбарын төрийн бус байгууллагуудаас санал авч ажлын даалгаврыг эцэслэснээр сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.	-	Норм
2.1.17	Монгол Улсын төмөр замын тээврийн тариф тогтоох аргачлал боловсруулах	580,000,000	0	580,000,000	-	-	-	Зам, тээврийн яамны ТНБД-ын баталсан Ажлын даалгаврын хүрээнд Үнэлгээний хороо сонгон шалгаруулалтын ТББ боловсруулж байна. Төмөр зам далайн тээврийн бодлого зохицуулалтын газраас санал авч батлуулснаар сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.	-	Норм
2.2	Стандарт	1,672,563,000	-	1,672,563,000	226,733,900	386,379,100				
2.2.1	"1520 мм царигтай төмөр замын зам" стандартыг боловсруулах	49,000,000	0	49,000,000	-	49,000,000	"Мөнгөн зөрлөг" ХХК	Гэрээний дагуу эхлэлийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Эхлэлийн шатанд	Стандарт

№	Төсөл, арга хэмжээний чиглэл, нэр	Гэрээний дүн, ₮	Өмнө олгосон дүн, ₮	Санхүүжилт		Хэрэгжүүлэх байгууллага, гэрээ №	Биелэлт	Явц	Төрөл
				2024-2025 онд олгох дүн, ₮	2024 онд олгосон				
2.2.2	MNS 6440:2014 "Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
	MNS 5012:2021 "Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.3	Төхсийн үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.4	MNS 5831:2007 "Улс хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.5	MNS 6300:2011 "Автомобильн үйлчилгээ. Зорчигч тээврийн авто буудал. Ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.	30,000,000	0	30,000,000	9,000,000	"ММЗэвлэх инженерүүдийн холбоо" ТББ, 2024-03-161	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Дунд шатанд	Стандарт
2.2.6	MNS 5231:2003 "Жуулчны авто тээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.7	MNS 5219:2002 "Таксиметр. Хэмжигзүйн болон техникийн шаардлага, туршилтын аргачлал ба туршилтын тайлангийн маяг" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.8	MNS 5218:2002 "Таксиметр. Ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
	MNS 5219:2002 "Таксиметр. Хэмжигзүйн болон техникийн шаардлага, туршилтын аргачлал ба туршилтын тайлангийн маяг" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.9	MNS 5218:2002 "Таксиметр. Ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.10	MNS 5219:2002 "Таксиметр. Хэмжигзүйн болон техникийн шаардлага, туршилтын аргачлал ба туршилтын тайлангийн маяг" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.11	MNS 5648:2006 "Төмс, хүнсний ногоо тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн нөхцөл Ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.12	MNS 5648:2006 "Үр тариа, гурил, будаа тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн нөхцөл. Ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.13	MNS 6688:2017 "Автомобильн хэрэгсэлээр мал амьтан тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.	30,000,000	0	30,000,000	9,000,000	ШУТИС-Бизнесийн ахисан түвшний сургууль 2024-03-159	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Дунд шатанд	Стандарт
2.2.14	MNS 5343:2011 "Хүнсний түргэн гэмтэх, эмзэг бүтээгдэхүүний тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.15	MNS 5344:2011 "Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.16	MNS 5346:2017 "Автомобильн хэрэгсэлээр ачаа тээвэрлэх ба тээвэрлэлтэд зухлах үйлчилгээ" стандартыг шинэчлэн боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.17	ISO 16844-1:2022 "Road vehicles — Tachograph systems — Part 1: Electromechanical components" стандартыг шинээр боловсруулах							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.18	ISO 16844-2:2022 "Road vehicles — Tachograph systems — Part 2: Recording unit communication interface" стандартыг шинээр боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.19	ISO 16844-3:2022 "Road vehicles — Tachograph systems — Part 3: Motion sensor communication interface" стандартыг шинээр боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.20	ISO 16844-4:2022 "Road vehicles — Tachograph systems — Part 4: Display unit communication interface" стандартыг шинээр боловсруулах.	60,000,000	0	60,000,000	36,000,000	"ММЗэвлэх инженерүүдийн холбоо" ТББ, 2024/03-133	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Дунд шатанд	Стандарт
2.2.21	ISO 16844-6:2022 "Road vehicles — Tachograph systems — Part 6: Diagnostic communication interfaces" стандартыг шинээр боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.22	ISO 16844-7:2022 "Road vehicles — Tachograph systems — Part 7: Parameters" стандартыг шинээр боловсруулах.							Дунд шатанд	Стандарт
2.2.23	"Хүйтэн асфальт-бетон хольц. Техникийн шаардлага" боловсруулах	17,000,000	0	17,000,000	6,800,000	"Шарк Танк" ХХК	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Дунд шатанд	Стандарт

№	Төсөл, арга хэмжээний чиглэл, нэр	Гэрээний дүн, ₮	Өмнө олгосон дүн, ₮	Санхүүжилт		Хэрэгжүүлэх байгууллага, гэрээ №	Биеэлэлт	Явц	Төрөл
			2024-2025 онд олгох дүн, ₮	2024 онд олгосон	Үлдэгдэл				
2.2.24	MNS ASTM D3910-2008 "Сплари сийл-ийг төсөлхөх, турших ба барих үед хэрэглэх заавар" стандартыг шинэчлэн боловсруулах	19,900,000	0	19,900,000	7,960,000	11,940,000	"Шарк Танк" ХХК	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн эцсийн шатны тайланд редакц шүүмж хийх ажлын хэсэгт хянагдаж байна.	Стандарт
2.2.25	MNS 6441:2014 "Авто зам, замын байгууламжийн техник ашиглалтын түвшинг тогтоох, үнэлэх аргачлал" стандартыг шинэчлэн боловсруулах	19,900,000	0	19,900,000	-	-	-	Тус төслийн ажлын даалгаврыг боловсруулах аяцад стандартыг шинэчлэн боловсруулах шаардлагагүй	Стандарт
2.2.26	ASTM D 4215-21 "Хүйтэн асфальтбетон хольц" стандартыг боловсруулах	19,000,000	0	19,000,000	7,600,000	11,400,000	"Шарк Танк" ХХК	Гэрээний дагуу боловсруулан ирүүлсэн эцсийн шатны тайланд редакц шүүмж хийх ажлын хэсэгт хянагдаж байна.	Стандарт
2.2.27	"Авто зам, замын байгууламжийн унн хучлагын дүрэм"-ийг дагаж мөрдөгдөх бэлц-26 стандарт боловсруулах	200,000,000	0	200,000,000	-	-	-	Ажлын даалгаварт Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас санал авч батлуулснаар сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.	Стандарт
2.3	Судалгаа	444,800,000	-	444,800,000	76,360,000	148,540,000			
2.3.1	Олон улс, улсын чанартай авто замд баригдсан ус зайлуулах байгууламжид үзлэг судалгаа хийж, шар унх үер, гадаргун ус нэвтрүүлэх чадварыг шинэчлэн тооцох судалгаа (Налайх-Чойр-Сайнаанд 2-р судалгааны зам: А0101, А0102, А0103 чиглэл)	138,847,500	0	138,847,500	-	-	-	Тендерийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг 2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр зарласан боловч гүйцэтгэгч байгууллага оролцоогүй тул тендер амжилтгүй болж дахин зарлахаар ажиллаж байна.	Судалгаа
2.3.2	Шугаман байгууламж (Авто зам, Төмөр зам)-ийн ус зүйн болон гидравликийн тооцооллыг тооцох арга, аргачлалыг шинэчлэх, боловсронгуй болгох суурь судалгаа	50,000,000	0	50,000,000	-	-	-	Ажлын даалгаварт Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Санбарын төрийн бус байгууллагуудаас санал авч ажлын даалгаврыг эцэслэнээр сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.	Судалгаа
2.3.3	Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээ болон техникийн хяналтын үзлэгийн үйл ажиллагаанд даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх судалгаа	40,000,000	0	40,000,000	12,000,000	28,000,000	"ШУТИС-Бизнесийн ахисан түвшний сургууль 2024-03-160	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Судалгаа
2.4	Авто замын сүлжээ болон норм дүрмийн хүргэмжийг сайжруулахтай холбоотой төсөл	228,847,500	-	228,847,500	12,000,000	28,000,000			
2.4.1	Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо бүрдүүлэх зөвлөх үйлчилгээ	94,800,000	0	94,800,000	28,440,000	66,360,000	"Монголын кибер довтолгоотой тэмцэх төв" ТББ	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Цахимжуулах
2.4.2	Зам, тээврийн санбарын нэгдсэн платформоор дамжуулж, их өгөгдлийг үүсгэх, олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэх портал сайт хөгжүүлэлт	94,875,000	0	94,875,000	85,387,500	9,487,500	"Интерактив" ХХК	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан боловсруулалтын шатанд байна.	Цахимжуулах
		189,675,000	-	189,675,000	113,827,500	75,847,500			
		2,535,885,500	-	2,535,885,500	428,921,400	638,766,600			
Гурав.	Үйл ажиллагааны зардал								
3.1	Дэлхийн авто замчдын нийгэмлэгийн гишүүнчлэл, нийгэмлэгийн олон улсын дэд хороодод гишүүн томилогдсон улсын улсын мэргэжлийн байгууллагын хамтын ажиллагаа, гишүүнчлэлийн зардал	100,000,000	0	100,000,000	35,475,700	64,524,300	Сангийн үйл ажиллагааны журмын 4.1.3 дахь заалт	Дэлхийн авто замын нийгэмлэгийн 2024 оны гишүүнчлэлийн төлбөрийг журмын дагуу олгосон. Олон улсын тээврийн форумын гишүүнчлэлийн зардал, тогтоол шийдвэрийн дагуу олгосон.	Гүйцэтгэл
3.2	Авто зам, замын байгууламжийн норм, норматив, техникийн баримт бичгийг боловсронгуй болгохтой холбоотой норм, норматив техникийн баримт бичиг, ном, аргачлал, зааврыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зардал	70,000,000	0	70,000,000	57,010,000	12,990,000	Сангийн үйл ажиллагааны журмын 2.11.3, 4.1.2 дахь заалт	Сангийн үйл ажиллагааны журмын 2.11.3, 4.1.2 дахь заалтын дагуу шинээр батлагдсан стандарт, норм норматив, техникийн баримт бичгийг мөрдүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулахтай холбогдуулан видео шторк хийх гэрээг "Эс Элбэг Трайд" ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлсэн. Гэрээний дагуу гэрээт ажлыг хүлээн авсан. "Данада Очир" ХХК-тай байгуулсан 2024/04/190 дугаар гэрээний хуулбар, "Тан бишрэл" ХХК-тай байгуулсан 2024/04-194 дугаар гэрээний хуулбар	Гүйцэтгэл
3.3	Норм норматив, техникийн баримт бичиг, стандарт, судалгааны ажлын тайлан, төсөлд редакц, шүүмж хийх ажлын хэсэг, зөвлөх байгйн зардал	80,000,000	0	80,000,000	40,360,628	39,639,372	Сангийн ажиллагааны журмын 2.11.4, 4.1.1 дэх заалтууд	2024-2025 онд хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний үе шатны тайлан, төсөлд редакц, шүүмж хийх төслүүдэд тус газрын Захирлын тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн гишүүдэд тооцсон цалинг олгож ажилласан.	Гүйцэтгэл
3.4	"Авто замын норм нормативын сангийн цахим систем" болон "Зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх үйл ажиллагааны цахим систем"-ийн байнгын хөгжүүлэлт, үйл ажиллагааны зардал	10,000,000	0	10,000,000	-	-	"Зетта Data" ХХК	Тус системийн нэмэлт хөгжүүлэлт, сайжруулалтыг гүйцэтгүүлэхээр систем ашиглагчаас өгсөн саналд үндэслэн Ажлын даалгавар боловсруулан батлуулж "Зетта data" ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.	Гүйцэтгэл

№	Төсөл, арга хэмжээний чиглэл, нэр	Гэрээний дүн, ₮	Өмнө олгосон дүн, ₮	2024-2025 онд олгох дүн, ₮	Санхүүжилт 2024 онд олгосон	Үлдэгдэл	Хэрэгжүүлэх байгууллага, гэрээ №	Биеэлт	Явц	Төрөл
3.5	Салбарын норм, норматив, техникийн баримт бичгийг боловсронгуй болгох чиглэлээр олон улсын эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран ажиллах, сургалт, технологи нэвтрүүлэх зардал.	340,000,000	0	340,000,000	187,505,000	152,495,000	Сангийн ажиллагааны журмын 4.1.4 дэх заалт	Авто замын даац хэтрэлт болон хяналтын удирдлагын тогтолцоо, системийг шинэчлэх бодлогын хүрээнд Зам тээврийн салбарын хяналтын 4 үйл ажиллагааны чиглэлээр ажиллаж байна. Телевелегений хүрээнд Авто замын даац хэтрэлтийг хянах авто пүү, хяналтын удирдлагын системийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа хийж, шинэчлэлтийн туршлага судлах, холбогдох судалгаа сургалт явуулах чиглэлээр гадаад мэргэжлийн байгууллагатай холбоо тогтоон хамтран ажиллаж байна. Шинэчлэлтийн ажлын дагуу холбогдох стандарт баримт бичгийг боловсронгуй болгох хүрээнд доорх байгууллагуудтай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлсэн. Гэрээ, Ахлын даалгаварт заасан үргийн биелэлт бүрэн хэрхэлсэн тул тус бүр гэрээг дүгнэх акт үйлдэн хүлээлцсэн. "Орд пресс" ХХК, "Сена" ХХК-тай байгуулсан 2024/03-24, 2024/03-25, 2024/03-26, 2024/03-28 дугаар гэрээ, "Өнөр буудай" ХХК-тай байгуулсан 2024-03-06 гэрээний дагуу гэрээ, "Чандгана цахир" ХХК-тай байгуулсан 2024/03-136 дугаар гэрээ, "Харш пресс"-тай байгуулсан 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 07 дугаар гэрээ "Чандгана цахир" ХХК-тай байгуулсан 2024/03-136 дугаар гэрээний хуулбар, Гэрээт ажил хүлээлцсэн акт эх хувь. "Харш пресс"-тай байгуулсан 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 07 дугаар гэрээний хуулбар, Гэрээт ажил хүлээлцсэн акт эх хувь. "Цэцэн цэцэрхүй" ХХК-тай байгуулсан 2024/03-147 дугаар гэрээний нүүр хуудас, тусгай нөхцөл. Тайлан хүлээлцсэн акт. "Ар кү эс эл чанар" ХХК-тай байгуулсан 2024/04-195 дугаар гэрээний хуулбар "Сономболдинг"-тай байгуулсан гэрээний хуулбар, Гэрээт ажил хүлээлцсэн акт эх хувь.	Гүйцэтгэл	
3.6	"Авто зам - Шинжлэх ухаан, технологи" сэтгүүлийн үйл ажиллагааны зардал	63,000,000	0	63,000,000	62,300,000	700,000	Сангийн ажиллагааны журмын 2.11.4, 4.1.1 дэх заалтууд	Авто замын салбарын Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр баримтгалж буй бодлого, төсөл арга хэмжээний мэдээлэл, нийтлэл, өгүүллийг сурталчлан таниулж буй уг сэтгүүлийн улирлын дугаарыг эхлэж таниулахад зориулж тус сэтгүүлийн хэвлэл олшруулах ажлыг гүйцэтгүүлж, 2024/03/47 дугаар гэрээ, "Хүлэг Монголын төлөө" НҮТББ-тай байгуулсан 2024/03/47 дугаар гэрээ, "Хүлэг Монголын төлөө" НҮТББ-тай байгуулсан 2023/03/48 дугаар гэрээ, "Аралуа" ХХК-тай байгуулсан 2024/03-137 дугаар гэрээ, "Аралуа" ХХК-тай байгуулсан 2024/03-173 дугаар гэрээний хуулбар, Гэрээний гүйцэтгэлийн акт эх хувь.		
3.7	Шинээр болон шинэчлэн батлагдсан норматив, стандарт, техникийн баримт бичиг, гарын авлага, зааврыг хэвлэн олшруулах ажлын зардал	50,000,000	0	50,000,000	22,068,000	27,932,000	Сангийн ажиллагааны журмын 2.11.4, 4.1.1 дэх заалтууд	Харш пресс ХХК-тай байгуулсан 2024/03-191 дугаар гэрээний хуулбар, Гэрээт ажил хүлээлцсэн акт эх хувь. "Өсөх пресс" ХХК-тай байгуулсан 2024/07-176 дугаар гэрээний хуулбар		
3.8	Зам, тээврийн салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөл, авто замын салбарын Шинжлэх ухаан, техникийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардал	40,000,000	0	40,000,000	28,209,939	11,790,061	Сангийн ажиллагааны журмын 4.1.6 дэх заалт	Зам тээврийн хөгжлийн сайд (хуучин нэрээр)-ын 2020 оны А/143 дугаар тушаалаар Зам тээврийн хөгжлийн яамны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн дүрмийг шинэчлэн баталж, Зөвлөл болон Дэд зөвлөлийн хурлын үйл ажиллагааны зардлыг тус сангаас олгохоор шийдвэрлэсэн. Үүний дагуу Зам, тээврийн яамнаас 4 дуагийн албан тоотот ирүүлсэн гишүүдийн цалин олгож ажиллаж байна. 2024 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04/1063 дугаар албан бичиг, 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 04/1724 дугаар албан бичиг, 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 04/1724 дугаар албан бичиг, 2024 оны 09 дугаар сарын 26-ны өдрийн 046/372 дугаар албан бичиг, 2024 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 06/1054 дугаар албан бичиг, 2024 оны 12 сарын 04-ны өдрийн 04а/2003 дугаар албан бичиг		
3.9	Сангийн орлогыг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих үйл ажиллагааны урсгал зардалын /бичиг хэрэг, шуудан, томилолт болон материаллаг шинж чанартай зардууд/ санхүүжилт	100,800,000	0	100,800,000	100,800,000	-	Сангийн ажиллагааны журмын 4.1.1, 4.1.5, 4.1.10 дэх заалтууд	Авто замын норм нормативын сангийн ажиллах журмын 2.11.1, 4.1.5, 4.1.10 дэх заалтын дагуу сангийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжигдсэн.		
	Үйл ажиллагааны нийт дүн	853,800,000	-	853,800,000	533,729,267	310,070,733				
	Он дамжсан нийт ажлын дүн	2,545,693,265	1,090,478,721	1,455,214,544	574,425,476					
	Шинээр хэрэгжих нийт ажлын дүн	2,535,885,500		2,535,885,500	398,321,400					
	Нийт дүн			4,844,900,044	1,506,476,143	3,338,423,901				
